BSMFO 031 LTN EN

Projekat: CD6C GVOZDAC / CS - Kopaonik (rev. 03)

Kupac Skijalista Srbije

LEITNER ropeways

ID	Opis zadatka	Detalji	Trajanje
1	**INŽENJERING**		**48 s**
2	Lokacijska dozvola		7 s
3	**Idejni projekat**	za revizionu komisiju ministarstva	**11 s**
4	Arhitektonsko/građevinski projekat	"	10 s
5	Mašinski projekat	"	10 s
6	Elektro projekat	"	10 s
7	Studija izvodljivosti	"	10 s
8	Javna diskusija o Studije uticaja na životnu sredinu	"	5 s
9	Studija uticaja na životnu sredinu	"	7 s
10	Izveštaj revizione komisije	"	9 s
11	Odgovori na komentare revizione kamisije		3 s
12	Priprema glavnih projekata		6 s
13	Autorizacije odgovornih institucija	rpublički zavod za vode, lokalna komunalna predužeća, kancelarija za zaštitu prirode, itd.	6 s
14	Procedura građevinskih dozvola	prijem dozvola i registracija gradilišta	6 s
15	Sertifikati za materijal / uputstva za održavanje		1 s
16	**GRADILIŠTE**		**21 s**
17	**ODOBRENJE -> POČETAK RADOVA**		**0 s**
18	**PRIPREMNI RADOVI**		**3 s**
19	Pristupni putevi / čisćenje / opremanje gradilišta		3 s
20	Čisćenje i otlanjanje šume		3 s
21	Rušenje postojećeg objekta	izlazna stanica je najhitnija	1 s
22	Geodetski kolčići		1 s
23	**GRAĐEVINSKI RADOVI**		**20 s**
24	**Trasa**		**13 s**
25	Temelji trase	11 temelja	9 s
26	Rov za kabl (signalni kabl)	dev. dužina circa 1.250m	6 s
27	**Povratna stanica**	**dno**	**20 s**
28	Zemljani radovi	iskopi	3 s
29	Temelji stanice	betonski radovi	11 s
30	Prizemlje / parking nosača	"	7 s
31	Prizemlje / kontrolna soba	prefabrikovana soba	3 s
32	Prizemlje / parking nosača	metalna struktura	4 s
33	Prizemlje / parking nosača	prekrivanje i prekrivači bočnih zidova	5 s
34	Okruženje / dodatni radovi	zgrada i završni radovi okruženja stanice	4 s
35	**Pogonska stanica**	**vrh**	**15 s**
36	Zemljani radovi	iskopi	1 s
37	Temelji stanice	betonski radovi	7 s
38	Prizemlje / pogonska i slabo strujna soba	temelji i prefabrikovana soba	5 s
39	Okruženje / dodatni radovi	zgrada i završni radovi okruženja stanice	4 s
40	**MONTAŽA / PUŠTANJE U RAD**		**11 s**
41	**Mehanička montaža**		**10 s**
42	**Trasa**		**8 s**
43	Stubovi	11 stubova	4 s
44	Helikopter		1 s
45	Povlačenje uža i splet	fi 46 mm.	2 s
46	**Pogonska stanica**	**vrh**	**4 s**
47	Struktura i pogon jedinica	fiksirani pogon	3 s
48	Pokrivka	visoka	2 s
49	**Povratna stanica**	**dno**	**4 s**
50	Struktura i povratna jedinica	povrat zategnut	3 s
51	Pokrivka	visoka	2 s
52	**Hidrauličke instalacije**		1 s
53	**Parking nosača / nosači**	**dno**	**3 s**
54	Parking nosača	semiautomatski	2 s
55	Nosači	60 šestoseda sa mehurom	1 s
56	**M-fino podešavanje**		2 s
57	**Kablovi za struju**		**5 s**
58	Trafo (priključak na napajanje)		1 s
59	E-žice instalacija		5 s
60	E-žice parking nosača		1 s
61	**Puštanje u rad**		**2 s**
62	Priključak na napajanje		0 s
63	Puštanje u rad struje		2 s
64	Interno ispitivanje		1 s
65	Odobrenje		1 g
66	Datum završetka		0 s

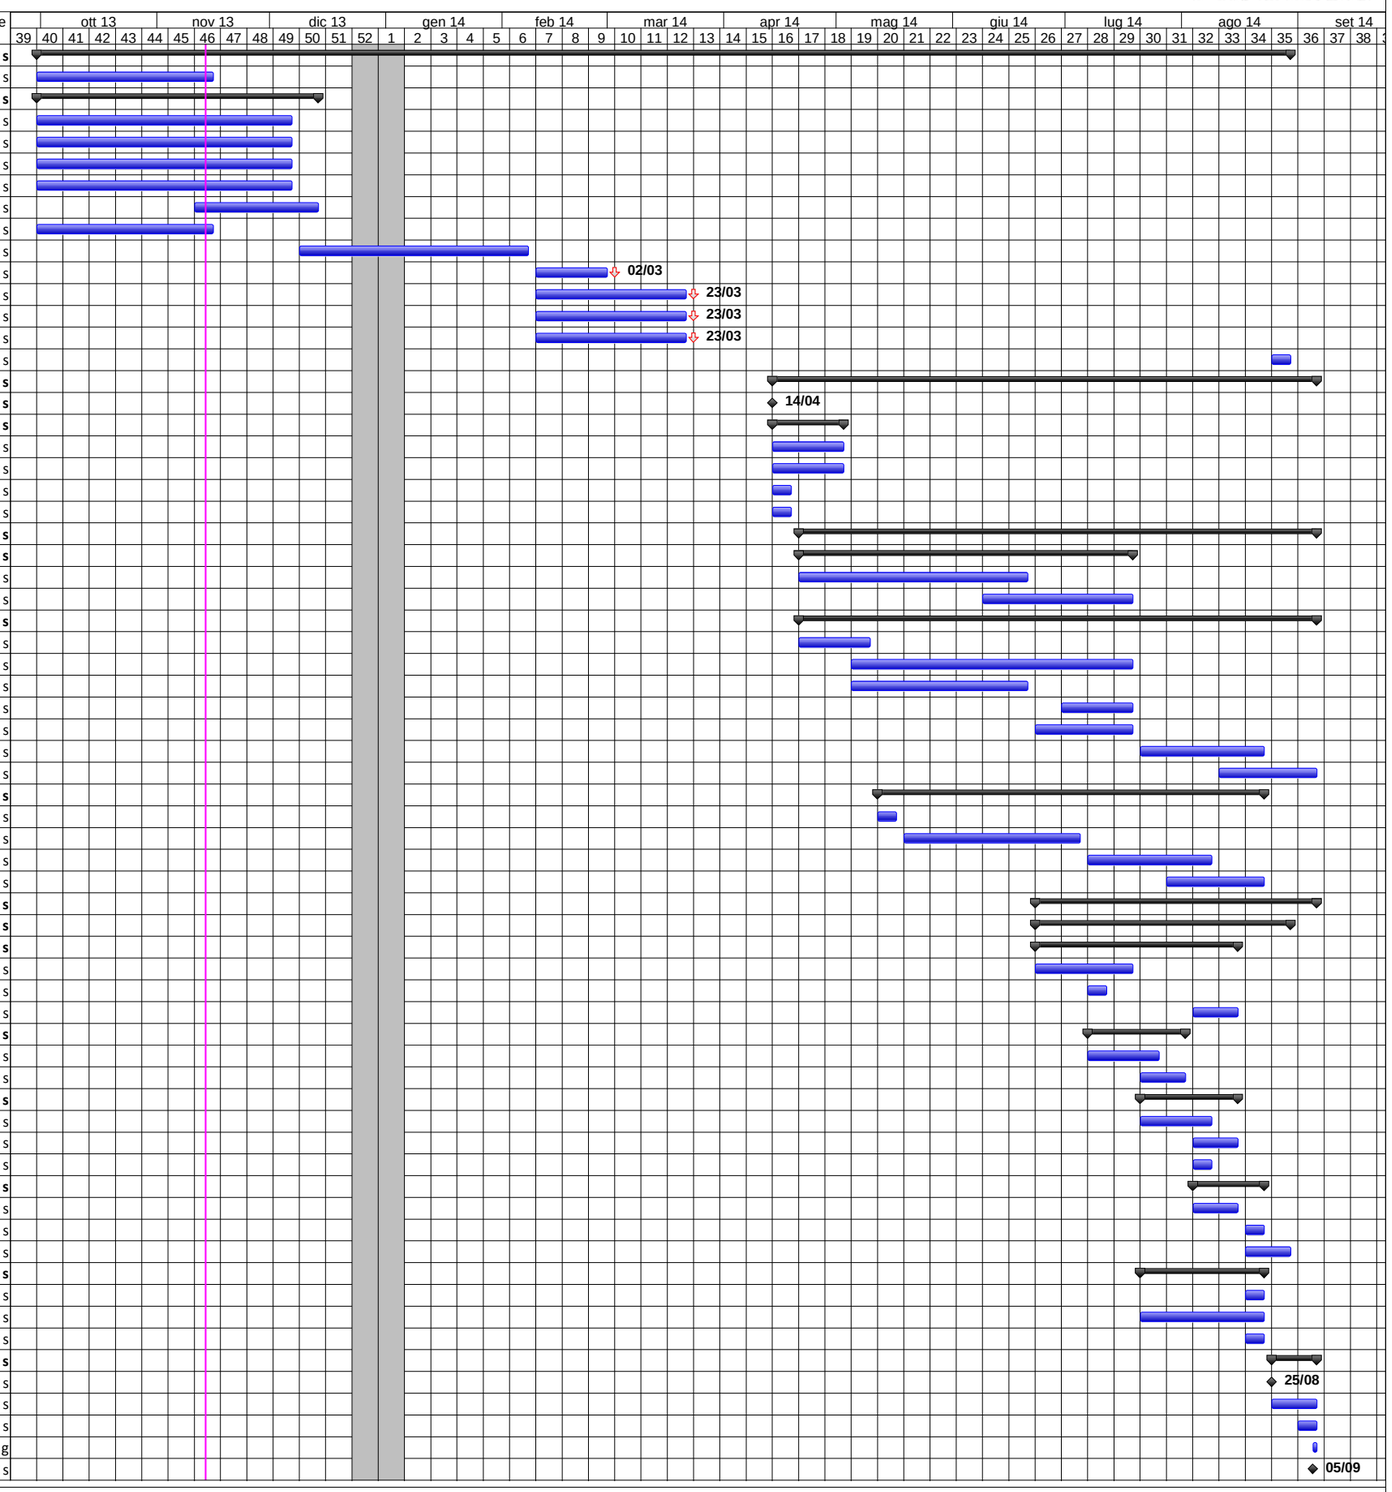

Revizija / datum: 03 / 14.11.13
Mapiranje: BSM / MEM

Zadatak — Prekid — Prekrtnica — Rezime zadatka — Rok — U toku
